


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							
COMPTRE RENDU N° 28					PV		
		Date de la visite :			Lundi 28/03/2022		
P1		Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS			00		
		Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS					
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE							
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots							
Marché n° : 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL			TELEPHONE		
Représenté par,		Mr Gabaudan dga@palavaslesflots.com			06 79 54 65 60		
		Mr Jeanjean portdepalavas@palavaslesflots.com			06 09 08 29 89		
		Mme Olivier audrey.olivier@palavaslesflots.com			06 43 49 95 04		
Architecte :		Mr Cascales cascales@architectes.org			06 09 71 23 25		
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella jma@jmatec.fr			06 06 49 69 19		
Coordinateur SSI :		SO					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone clement.dadone@btp-consultants.fr			06 46 70 77 47		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	CONVOCA TION n°29	Abs* n
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle Adeline BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Exc	1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Exc	1	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	1	3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Pre	0	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	0	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	1	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	NC	1	8
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Exc	1	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	1	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	1	13
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07	NC	0	
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **[0]** - Non convoqué **[1]** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

**Abs*
n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCAATION N° 29

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 04 Avril 2022 à 14:30

COMPTE RENDU N° 28

TRAVAUX Semaine n°18 : du 14 au 18 mars 2022 / Semaine n°11-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :		
3	► DEMANDE de mise en attente du coulage de la chape liquide (R+1)		
4	IDEM pour la dalle béton du R+2 pour cause d'infiltration du toit terrasse		
5	► <u>Lot 05</u> : ANALYSE DEVIS SODAC n°305.2022 mis à jour. (Pas d'avenant sur indice)		
6	► <u>Lot 06 & 07</u> : En attente de signature des avenant en TS		
7	► CT / BTP Consultant :		
8	> Avis suspendu sur la longueur d'ancrage des goujons en pied de poteaux CMA / FDV n°6	RAPPEL	
9	> Avis suspendu : Demande de plan de pose du Cofradal* / FDV n°8		
10	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15		
11	► CSPS / Cf. Registre de Journal n°19		RAPPEL
12	Demande de création passerelle + GC entre tour d'accès et coursive pour sécuriser l'accès		

13	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL	Convocation n° 29	OUI
14	DALLAGE industriel : ► SOREDAL Tony.SOARES@soredal.com 06 75 08 44 96		
15	Poser le treillis soudé (ST.15c) sous tapis d'entrée encastré. - FOURNIR PLAN de RESERVATION -		
16	<u>Définition de l'état de surface (DTU21)</u> : Lissé / destiné à recevoir un revêtement de sol collé		
17	<u>Tolérance de planéité</u> : 7 mm sous la Règle de 2 mètres		
18	ACROTÈRES	► INTERVENTION	Mercredi & jeudi 30 et 31/03/2022
19	► En attente pour validation CT :		
20	> Fiche technique du béton fibré ou équivalent		Cf. Annexe A3
21	> Fiche technique du joint de dilation		
22	► GT SANITAIRES (Cf. PV n°25)		
23	Rez-de-chaussée : Ouverture des gaines techniques pour réparation des descentes EP		
24	► VRD		
25	Prévoir regard et évacuation des EP (sortie R+2) au droit du poteau, suivant Plan n°41 ind C :		
26	Cf. Annexe A1		

27	► LOT 02 : CMA	Convocation n° 29	OUI	
28	IMPORTANT : Livraison ascenseur semaine n°15			
29	L'entreprise CMA doit tout mettre en œuvre pour respecter le planning de pose ascenseur			
30	RDC > La fragilité du film à bulle ne protège pas la base des poteaux contre des travaux de VRD à venir. L'entreprise CMA doit proposer un renfort de protection.			
31	► INTERVENTION SEMAINES n°13 & 14/2022			
32	RDC > Tracer sur site le départ de l'escalier (Cf. PV n°27)			
33	R+1 > Mettre en œuvre poutres, solives et poteaux du palier ascenseur			
34	R+1 > Platelage provisoire pour réglage ascenseur + filet de protection			
35	R+2 > Mise en place de la structure du pare-soleil			
36	R+2 > Platelage provisoire pour réglage ascenseur + filet de protection			
37				
38	► LOT 03 : CMA	Convocation n° 29	OUI	
39	ETANCHEITE : (Support béton)			
40	Demande de création d'une entrée d'eau supplémentaire Ø80 mm (verticale) pour supprimer le flash d'eau du toit terrasse. <u>LOCALISATION</u> : à définir in situ à proximité du poteau rectangulaire le plus au nord			
41	► MISE EN EAU : Dépendamment des conditions météo, une prochaine mise en eau sera effectuée le, jeudi 31 mars 2022			
42	► PROTECTION N°01 : (CHANTIER) R+2			RAPPEL
43	> Mise en place d'un <u>couloir d'accès</u>			
44	> Création d'une <u>plateforme de livraison</u> sur la coursive			
45	► PROTECTION N°02 : (SOUS COFRADAL*) R+2			
46	> Protection provisoire TYPE BÂCHES sera mis en place sous le plancher du Cofradal*			
47	ETANCHEITE : (Support bac acier)			
48	En ATTENTE de la sortie VMC			
49				
50				<p style="color: red;">Vue des découpes chantier sur tôles costières (Protection galva en attente)</p>






51	► INTERVENTION ASTEN	► INTERVENTION SEMAINES n°14/2022	
52	Fournir Dossier EXE et fiches produits		
53	Réfèrent ASTEN (Mr Rouina : 06 11 30 33 68)		
54	BARDAGE : (Double peau)		
55	L'entreprise CMA doit finaliser prioritairement le niveau allège du bardage avec :		
56	> Pose isolant thermique / CLADIPAN LV 32 110MM		
57	> Pose du pare-pluie DELTA-FASSADE*20 y compris DELTA®- FLEXXBAND 80 mm		
58	URGENT > Bavette d'appuis pour menuiseries sur traverse (Tube 80x80 mm)		
59	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM	Convocation n° 29	OUI
60	PLANNING :		
61	► APPROVISIONNEMENT & mise à disposition : Semaine n°14/2022 (Châssis & vitrage)		
62	L'entreprise FR-ALU doit assurer le hors d'air (pose du vitrage semaine n°15)		
63	RAPPEL : Fournir le détail technique du plafond SAS		
64	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 29	NON
65	Réfèrent Chantier pour SODAC : a.jansen@sassodac.fr	06 76 05 26 12	
66	Préparation du rétro planning en cours avec :		
67	> Intervention en attente chape, dalle, clos et couvert.		
68	> En attente de validation du tracé des cloisons in situ		
69	> Principe de calepinage du faux plafond à définir		
70	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 29	NON
71	Mise à jour de l'avenant TS pour signature MOA		
72	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 29	OUI
73	IMPORTANT : Livraison ascenseur semaine n°15		
74	L'entreprise Gayraud doit permettre l'alimentation pour les tests et les réglages ascenseur.		
75	Le caractère définit ou provisoire de l'installation électrique (+ protection) est à déterminer		
76	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 29	OUI
77	IMPORTANT : Livraison ascenseur semaine n°15		
78	L'entreprise doit fournir la description du mode opératoire pour la mise en place du pylône, avec : Accès livraison / Appareil de levage / Mise en place des parois / Protection chantier de l'ascenseur / etc.		
79	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 29	OUI
80	► R+1 / Chape liquide	NIVEAU FINI : Seuil existant (- 5 mm)	
81	<u>Intervention</u> : Fin de semaine n°14, sous réserve des résultats de la mise en eau du toit terrasse.		
82	► R+2 / RESERVATION Tapis d'entrée	24/03/2022 / VISA n°10-1 à observations bloquantes	
83		Annexe A2	
84	> FOURNIR PLAN de RESERVATION < Confit du tapis d'entrée encastré et treillis soudé (ST.15c)		

85	► LOT 11 : EDISON	Convocation n° 29	OUI
86	IMPLANTATION PANNEAUX	EN ATTENTE	
87	Sur la base du plan d'implantation N°59, fournir les études de la STRUCTURE des panneaux		
88	Option retenue : Structure métallique galvanisé (Type HEA) fixée sur "dalles" béton sur Styrodur		
89	RAPPEL : avis BTP Consultant		
90	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15		

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	Plan n°41 ind C
A2	VISA n°10-1 à observations bloquantes
A3	20220330_MARORY_weberep_rapide

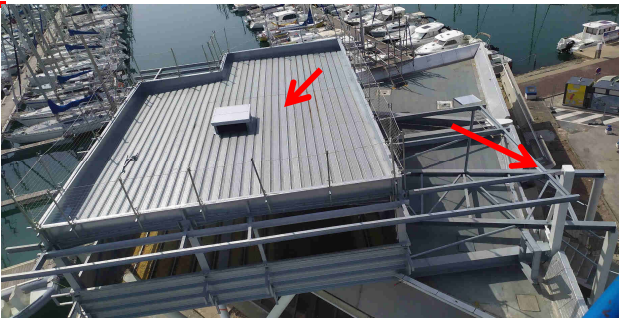LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjIFq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 28/03/2022

▼ 01	▼ 02	▼ 03
		
▲ 04	▲ 02	▲ 05
		
01	► Vue d'ensemble avec sortie VMC et renfort liaison IPN / TUBE en attente	
02	► Reprise béton nez de dalle et acrotère en attente	
03	► Vue des coupures chantier sur tôles costières (+ protection galva en attente)	
04	► Découpe de l'allège béton en attente (Réservation ascenseur)	
05	► Découpe soignée de la trémie (GT Yacht-club) à FAIRE avant chape liquide.	
